

White & Raw Sugar Stores (2nd Phase) Projects


Progress Analysis Report

4-Apr-2024




Raw Sugar

نوع الأعمال	توريد	تركيب	التقدم بالأعمال
أعمال مدنية ⁽¹⁾	80%	70%	████████
هياكل معدنية	100%	100%	████████
صاج ساندوتش	100%	100%	████████
حليات	100%	100%	████████
شبابيك تهوية	100%	100%	████████
شبكة إطفاء الحريق ⁽²⁾	95%	95%	████████
أعمال كهرباء وإنارة ⁽³⁾	100%	100%	████████

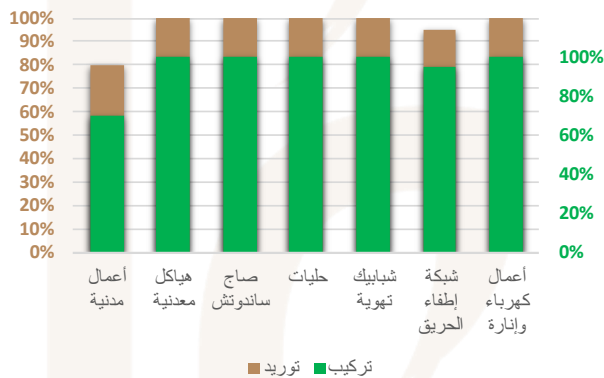

White Sugar

نوع الأعمال	توريد	تركيب	التقدم بالأعمال
أعمال مدنية ⁽¹⁾	99%	98%	████████
هياكل معدنية	100%	100%	████████
صاج ساندوتش	100%	100%	████████
حليات ⁽²⁾	100%	100%	████████
شبابيك تهوية ⁽³⁾	100%	100%	████████
شبكة إطفاء الحريق ⁽⁴⁾	95%	40%	████████
أعمال كهرباء وإنارة ⁽⁵⁾	100%	98%	████████

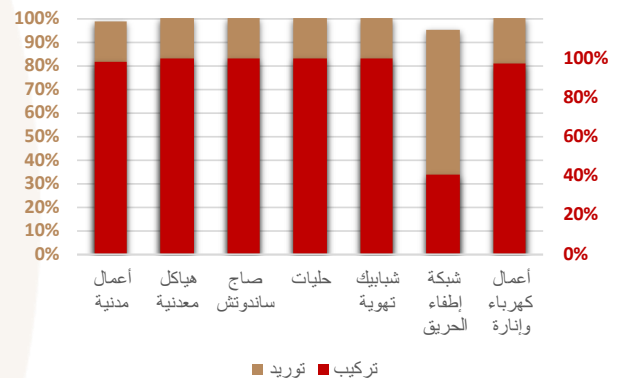

(1) تم الإنتهاء من جميع الأعمال المدنية فيما عدا أبواب المخزن الرئيسية فلم يتم توريدها بعد.

(2) تم الإنتهاء من تركيب شبكة إطفاء الحريق فيما عدا المدافع والقواعد الخاصة بها علماً بأنه تم توريد المدافع لكن لم يتم توريد القواعد الخاصة بها بعد وكذلك بالنسبة للمدافع والقواعد الخاصة بها بمخزن السكر الأبيض رقم 2.

(3) تم الإنتهاء من أعمال الكهرباء والإنارة بالكامل وتسليمها فيما عدا توصيل كابل التغذية الرئيسي علماً بأنه ليس في نطاق تعاقد شركة نديسكو.

(1) تم الإنتهاء من أعمال دهان أعمدة المخزن بالكامل، باستثناء أعمدة الحوائط الثلاثة للمخزن وسيتم البدء بهم اول الأسبوع وسيتم الإنتهاء منهم خلال الأسبوع.

(2) تم الإنتهاء من تركيب جميع الحليات بالمخزن.

(3) تم الإنتهاء من تركيب جميع شبابيك التهوية بالمخزن.

(4) جاري إستكمال الأعمال ولكن يسير العمل ببطئ شديد مع قلة العمالة.

(5) تم الإنتهاء من تركيب جميع كشافات المخزن وجاري إستكمال الأعمال بتركيب الـ Power Sockets.

